

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧИЕ ПЛАНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ПОДСИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РЕЗУЛЬТАТ**

Январь, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ	3
1 ЗАПУСК СИСТЕМЫ	4
2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ЗАКАЗЧИКАМ И ОБЪЕКТАМ ...	6
2.1 Распределение результата с типом «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества» ...	10
2.1.1 Распределение результатов, реализуемых без участия регионов	10
2.1.2 Распределение результатов, реализуемых с участием регионов	20
2.2 Распределение результатов с типом «Принятие нормативного правового (правового) акта»	22
3 РАБОЧИЙ ПЛАН ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА.....	34
4 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧИЙ ПЛАН.....	38

ГЛОССАРИЙ

Термин, сокращение	Определение
ВПО	Ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти
ДКТ	Дополнительная контрольная точка
КТ	Контрольная точка
НПА	Нормативно-правовой акт
Подсистема УНП	Подсистема «Управление национальными проектами» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
Система	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
ФОИВ	Федеральный орган исполнительной власти
Заказчик	Для объекта капитального строительства – ответственный исполнитель объекта результата; Для объекта НПА – Ответственный ФОИВ

1 ЗАПУСК СИСТЕМЫ

Для начала работы с функционалом рабочих планов необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- запустить интернет-обозреватель двойным нажатием левой кнопки мыши по ярлыку на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск» и в открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий интернет-обозревателю;
- в адресной строке интернет-обозревателя ввести адрес:
<https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp>.

Авторизация пользователей производится в системе «Электронный бюджет». Для входа в Систему необходимо использовать персональные логин и пароль, выданные администратором (Рисунок 1).




Рисунок 1. Окно авторизации

Для перехода к рабочим планам необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- из реестра меню «Подсистема управления национальными проектами» системы бюджетного планирования произвести переход в подсистему УНП (Рисунок 2);




Рисунок 2. Переход в подсистему УНП

- в результате откроется главная страница Системы (Рисунок 3);

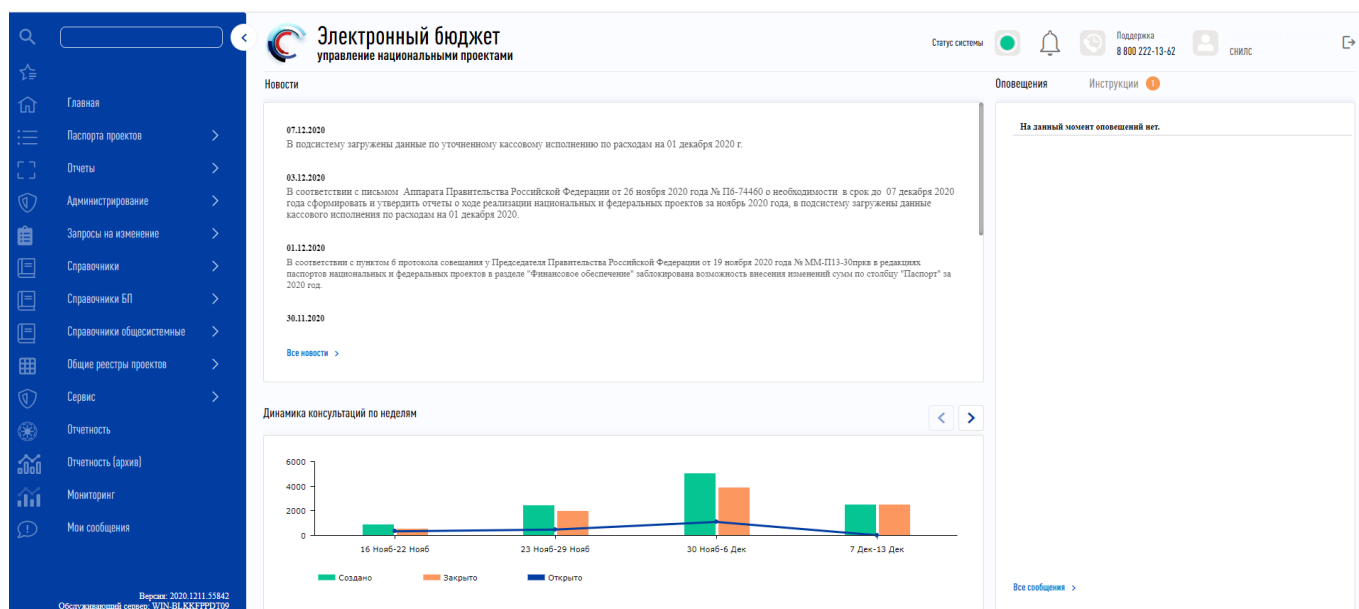


Рисунок 3. Главная страница Системы

2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ЗАКАЗЧИКАМ И ОБЪЕКТАМ

Работа по формированию рабочего плана осуществляется в действующей редакции паспорта федерального проекта, пользователями, обладающими ролью «Ответственный исполнитель результата». (Рисунок 4).

The screenshot displays the 'ФП: Паспорт проекта Культурная среда' (Federal Project: Passport of the Project Cultural Environment) interface. The top navigation bar includes a 'Печать паспорта' (Print Passport) button and a 'Перейти к распределению по РП' (Go to Distribution by RP) button. The 'Дата версии' (Version Date) is set to 'текущий момент' (Current Moment). The 'Редакция' (Edition) dropdown is set to 'Действующая редакция - A1-2020/053 - 14.12.20' (Active Edition - A1-2020/053 - 14.12.20). The 'Версия паспорта' (Passport Version) is 'Версия 37' (Version 37). The left sidebar shows a tree structure of project sections, with '8. Распределение по субъектам' (Distribution by Subjects) selected. The main content area displays the 'Национальный проект: (А) Культура' (National Project: (A) Culture) section. It includes fields for 'Наименование' (Name), 'Код проекта' (Project Code), 'Код проекта (по БК)' (Project Code (by BK)), 'Краткое наименование' (Short Name), 'Дата начала' (Start Date), 'Дата окончания' (End Date), 'Куратор проекта' (Project Curator), 'Руководитель проекта' (Project Manager), and 'Администратор проекта' (Project Administrator). The 'Наименование' field contains 'Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)' (Ensuring a qualitatively new level of development of cultural infrastructure («Cultural environment»)). The 'Код проекта' and 'Код проекта (по БК)' fields both contain 'A1'. The 'Краткое наименование' field contains 'Культурная среда' (Cultural environment). The 'Дата начала' field contains '01.01.2019' and the 'Дата окончания' field contains '31.12.2024'. The 'Куратор проекта' field contains 'Чернышенко Дмитрий Николаевич - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации' (Chernyshenko Dmitry Nikolaevich - Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation). The 'Руководитель проекта' field contains 'Осинцев Владимир Геннадьевич - Заместитель Министра культуры РФ' (Osinets Vladimir Gennadievich - Deputy Minister of Culture of the Russian Federation). The 'Администратор проекта' field contains 'Карташев Павел Викторович - Заместитель директора Департамента' (Kartashov Pavel Viktorovich - Deputy Director of the Department).

Рисунок 4 – Действующая редакция паспорта

В действующей редакции паспорта автоматически будет создана версия Рабочего плана в статусе «Черновик». Версия рабочего плана отображаются в разделе «13.7 Версии рабочего плана» (Рисунок 5).

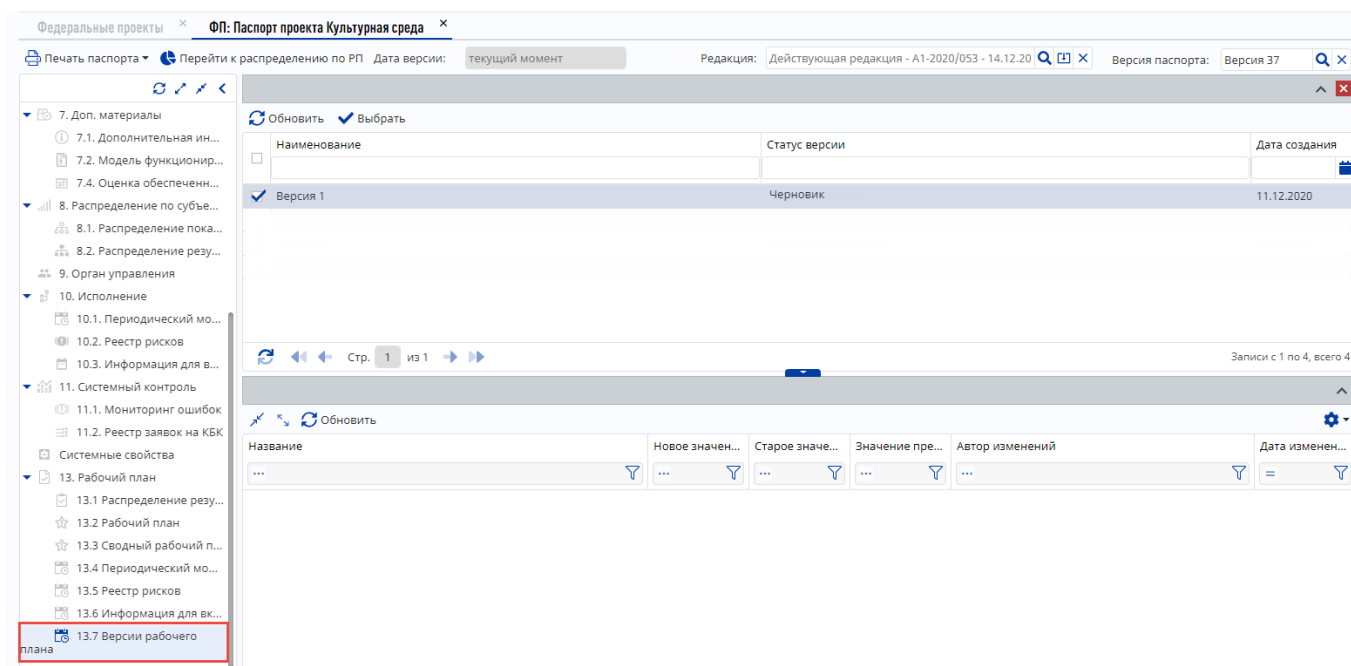


Рисунок 5 – Версия рабочего плана «Черновик»

В данный раздел предназначен для отображения всех версий документа Рабочий план. После утверждения версии «Черновик» (описание процесса в разделе «4. Согласование рабочего плана», она станет действующей версией документа. Действующая версия может быть только одна. Все предыдущие версии закрываются автоматически в момент утверждения версии «Черновик». Для перехода в нужную версию необходимо выделить запись и нажать кнопку «Выбрать».

Формирование рабочего плана начинается с распределения результатов проекта по Заказчикам, объектам, а также формированию информации о датах достижения, ответственных исполнителях, объектах результатов и их контрольных точках. Данное распределение является источником данных для автоматического формирования рабочего плана.

Примечание. В настоящее время формирование рабочих планов в подсистеме УНП осуществляется только для результатов с типами:

- строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества;
- принятие нормативного правового акта.

Отображение данных в форме распределения зависит от роли пользователя. Отображение данных настроено для следующих ролей:

- Руководитель проекта - данные отображаются без ограничений;
- Администратор проекта - данные отображаются без ограничений;
- Ответственный исполнитель результата – данные отображаются по результатам, в которых пользователь указан ответственным исполнителем а также по объектам, которые реализуются в рамках таких результатов и их контрольных точек;
- Ответственный за объект результата (Заказчик) - данные отображаются по результатам, объектам, которые реализуются в рамках результата, и по которым пользователь указан ответственным исполнителем, а также по всем контрольным точкам объектов результатов;
- Ответственный исполнитель контрольной точки - данные отображаются по результатам, объектам, которые реализуются в рамках результата, а также контрольным точкам, по которым пользователь указан ответственным исполнителем.

Для начала работы по распределению результатов по заказчикам и объектам необходимо перейти в паспорт соответствующего федерального проекта.

Для перехода в паспорт федерального проекта необходимо:

- выбрать пункт «Федеральные проекты». В данном разделе будет выведен список федеральных проектов, к которым у авторизованного пользователя назначен доступ (Рисунок 6);




Рисунок 6. Федеральные проекты

- выбрать проект и перейти в его карточку, дважды нажав по записи левой кнопкой мыши, либо нажав кнопку «Перейти в паспорт» (Рисунок 7);

Федеральные проекты

Обновить

Добавить

Редактировать

Перейти в паспорт

Удалить

Направить на согласование

Реестр согласования

Выгрузить в ЕПБС

Код проекта	Код по БК	Наименование	Куратор	Руководитель проекта	Организация руководителя проекта	Стадия	Срок реализации		Дата последнего изменения	Дата утверждения
							Начало	Окончание		
G1	G1	Чистая страна	Абрамченко Викт...	Керимов Мурад К...	МИНИСТЕРСТВО ...	Реализация	01.10.2018	31.12.2024	17.11.2020	23.11.2020
G3	G3	Инфраструктура для обращения с отход...	Абрамченко Викт...	Комаров Кирилл ...	ГОСУДАРСТВЕННА...	Реализация	01.10.2018	31.12.2024	17.11.2020	23.11.2020

Рисунок 7. Переход в карточку федерального проекта

- выбрать раздел меню «13.1 Распределение результатов по заказчикам и объектам» (Рисунок 8);

Федеральные проекты

ФП: Паспорт проекта Инфраструктура для обращения с отходами I...

Печать паспорта

Перейти к распределению по РП

Дата версии: текущий момент

Редакция: Действующая редакция - G3-2020/012 - 19.11.20

Версия паспорта: Версия 14

Обновить

Редактировать

Фильтр по заказчику

Получить последнюю версию проекта из УНП

Тип результата	Единица измерения	Реализуется регионом	Значение	Дата достижения значения результата	Значение на год	Распределено	Остаток
G3.03.03 Разработана, утверждена и введена в действие федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности Значение: 1,0000, Дата достижения: 31.12.2020, единица измерения: Штука							
Принятие норматив...	Штука	Нет	1,0000	31.12.2020	1,0000	1,0000	0,0000
G3.03.06 Перепрофилированы объекты по уничтожению химического оружия в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. Значение: 4,0000, Дата достижения: 29.12.2023, единица измерения: Штука							
Строительство (реко...	Штука	Нет	4,0000	29.12.2023	4,0000	2,0000	2,0000
G3.03.07 Реализованы инфраструктурные проекты по созданию объектов обращения с отходами I и II классов опасности в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности. Значение: 3,0000, Дата достижения: 31.12.2024, единица измерения: Штука							
Строительство (реко...	Штука	Нет	3,0000	31.12.2024	3,0000	0,0000	3,0000
Заказчики							
Заказчик			ИНН	Распределено значений			
				29.12.2023			
			Итого:	2,0000			
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РО...			7706413348	2,0000			

13.1 Распределение результатов по заказчикам и объектам

13.2 Рабочий план

13.3 Сводный рабочий план

13.4 Периодический мониторинг

13.5 Реестр рисков

Рисунок 8. Раздел «13.1 Распределение результатов по заказчикам и объектам»

В данном разделе отображаются результаты федерального проекта, в которых текущий пользователь является ответственным за результат. Отображаемые результаты делятся на два вида: реализуемые с участием регионов и реализуемые без участия регионов. Данный признак отображается в колонке «Реализуется регионом». Вид результата определяет особенности распределения значений по объектам, описанные ниже.

2.1 Распределение результата с типом «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества»

2.1.1 Распределение результатов, реализуемых без участия регионов

Для распределения результата федерального проекта с типом «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества», в реализации которого не участвуют регионы, необходимо выполнить следующие действия:

- выбрать результат федерального проекта, у которого в колонке «Реализуется регионом» указано значение «Нет», и нажать кнопку «Редактировать» (Рисунок 9)

Тип результата	Единица измерения	Реализуется регионом	Значение	Дата достижения значения результата	Значение на год	Распределено	Остаток
G3.03.03 Разработана, утверждена и введена в действие федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности							
Принятие норматив...	Штука	Нет	1,0000	31.12.2020	1,0000	1,0000	0,0000
G3.03.06 Перепрофилированы объекты по уничтожению химического оружия в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности.							
Значение: 4,0000, Дата достижения: 29.12.2023, единица измерения: Штука							
Строительство (реко...	Штука	Нет	4,0000	29.12.2023	4,0000	2,0000	2,0000
G3.03.07 Реализованы инфраструктурные проекты по созданию объектов обращения с отходами I и II классов опасности в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.							
Значение: 3,0000, Дата достижения: 31.12.2024, единица измерения: Штука							
Строительство (реко...	Штука	Нет	3,0000	31.12.2024	3,0000	0,0000	3,0000
Заказчики							
Заказчик	ИНН	Распределено значений					
		29.12.2023					
Итого:							2,0000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РО...		7706413348	2,0000				

Рисунок 9. Редактирование результата

В открывшемся окне отображаются данные, сформированные автоматически на основании данных паспорта проекта (результаты, в рамках которых реализуются объекты капитального строительства и декомпозированные КТ из Общего плана проекта) и данных по объектам капитального строительства из программного модуля «Бюджетные инвестиции» подсистемы бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет».

По результатам, в рамках которых реализуются объекты капитального строительства, декомпозированным контрольным точкам объектов результатов, датам достижения, ответственным исполнителям возможна последующая корректировка данных в части дат достижения, ответственных исполнителей, а также установления вида работ результата и добавления дополнительных контрольных точек (Рисунок 10).

(A1.01.03) Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды									
Обновить Добавить Просмотр Удалить Массовое добавление ДКТ Просмотр объекта Легенда									
Наименование заказчика/объекта/контрольной точки	ИНН	Код ОКС	Вид работ результата	КТ не исп.	Ед. изм.	Значение	Дата достижения	Ответственный исполнитель	
Значение результата на 01.12.2020: распределено 1,0000 из 1,0000									
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТ...	7705443646				Единица	1,0000	01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
00000000035026 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры ...		000000000350...			Единица	1,0000	01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(1) Земельный участок предоставлен заказчику				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(2) Получены положительные заключения по результатам государственных эк...				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(3) Получено разрешение на строительство (реконструкцию)				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(4) Строительно-монтажные работы завершены				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(5) Оборудование приобретено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(6) Оборудование установлено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(7) Оборудование введено в эксплуатацию				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(8) Техническая готовность объекта, %				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(9) Заключение органа государственного строительного надзора получено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества п...				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(12) Закупка включена в план закупок				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(13) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реес...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(14) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказа...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(15) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказан...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(16) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физик...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(17) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсид...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(18) Тест				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	

Рисунок 10. Окно редактирования результата

Для корректировки данных необходимо выбрать объект и нажать кнопку «Редактировать» (Рисунок 11).

(A1.01.03) Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды									
Обновить Добавить Редактировать Удалить Массовое добавление ДКТ Просмотр объекта Легенда									
Наименование заказчика/объекта/контрольной точки	ИНН	Код ОКС	Вид работ результата	КТ не исп.	Ед. изм.	Значение	Дата достижения	Ответственный исполнитель	
Значение результата на 01.12.2020: распределено 1,0000 из 1,0000									
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТ...	7705443646				Единица	1,0000	01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
00000000035026 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник", строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, г. Рязань, ул. Соборная, д. 20 а. Внесение изменений		000000000350...			Единица	1,0000	01.12.2020		
(1) Земельный участок предоставлен заказчику				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...	
(2) Получены положительные заключения по результатам государственных эк...				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020		
(3) Получено разрешение на строительство (реконструкцию)				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020		
(4) Строительно-монтажные работы завершены				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020		
(5) Оборудование приобретено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020		
(6) Оборудование установлено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020		
(7) Оборудование введено в эксплуатацию				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020		
(8) Техническая готовность объекта, %				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020		
(9) Заключение органа государственного строительного надзора получено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020		
(10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020		
(11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества п...				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020		
(12) Закупка включена в план закупок				<input type="checkbox"/>			01.12.2020		
(13) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реес...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020		
(14) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказа...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020		

Рисунок 11. Редактирование объекта

В открывшемся окне для редактирования доступно:

- изменение ответственного исполнителя для Заказчика (по умолчанию указан руководитель организации Заказчика);
- выбор вида работ результата по объектам результата (при выборе вида работ набор декомпозированных контрольных точек из паспорта проекта из раздела «Общий план» может измениться);

- изменение ответственного исполнителя объекта результата;
- создание дополнительных контрольных точек объекта результата.

Для изменения ответственного исполнителя для Заказчика необходимо:

- нажать на кнопку «лупа» в поле «Ответственный исполнитель» (Рисунок 12);

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закреть

Заказчик

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Д' ИНН: 7705443646 КПП: 770701001

Ответственный исполнитель: Осинцев Владимир Геннадьевич Должность: Заместитель Министра культуры РФ

Объект

Обновить + Добавить - Удалить Поиск Просмотр объекта Распределены все значения результата 1,0000 на 01.12.2021

Код	Наименование	Вид работ результата	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Координаты согласно ГЛОНАСС	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
00000000035026	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник", строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного	Не указано			01.12.2021	Осинцев Владимир Геннадьевич	

Дополнительные контрольные точки

Обновить + Добавить - Удалить Редактировать

Наименование КТ	Дата достижения	Ответственный	Не используется
	=		

Рисунок 12. Заказчики и объекты

- в открывшемся окне выбрать необходимого сотрудника и нажать кнопку «Выбрать» (Рисунок 13).




Рисунок 13. Изменение ответственного

2.1.1.1 Редактирование данных объекта результата

По объекту результата редактированию подлежат следующие данные:

- вид работ результата (при выборе вида работ результата изменится набор декомпозированных КТ из паспорта проекта из раздела «Общий план»);
- дата достижения;
- ответственный исполнитель объекта результата

Для редактирования поля «Вид работ результата» необходимо нажать кнопку «карандаш» в поле «Вид работ результата» и выбрать значение из раскрывающегося списка (Рисунок 14).

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть

Заказчик

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "И" ИНН: 7705443646 КПП: 770701001

Ответственный исполнитель: Радченко Андрей Александрович Должность: ВРИО руководителя

Объект

Обновить + Добавить - Удалить Поиск Просмотр объекта **Распределены все значения результата 1,0000 на 01.12.2021**

Код	Наименование	Вид работ результата	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Координаты согласно ГЛОНАСС	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
00000000035026	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник", строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного	Не указан			01.12.2021	Радченко Андрей Александрович	

Дополнительные контрольные точки

Обновить + Добавить - Удалить

Наименование КТ	Дата достижения	Ответственный	Не используется
	=		

Рисунок 14. Редактирование вида работ результата

Поле «Дата достижения» автоматически заполняется датой достижения значения результата. Для редактирования значения необходимо нажать кнопку «календарь» и выбрать дату.

Примечание. В Системе настроен контроль на не превышение даты достижения значения результата.

Поле «Ответственный исполнитель» заполнено по умолчанию ответственным исполнителем Заказчика (указан руководитель организации Заказчика). Ответственного исполнителя можно редактировать путем выбора значения из справочника «Ответственный исполнитель».

Для сохранения данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 15)

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть

Необходимо сохранить данные по объекту

Заказчик

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "И" ИНН: 7705443646 КПП: 770701001

Ответственный исполнитель: Радченко Андрей Александрович Должность: ВрИО руководителя

Объект

Обновить + Добавить - Удалить Поиск Просмотр объекта Распределены все значения результата 1,0000 на 01.12.2021

Код	Наименование	Вид работ результата	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Координаты согласно ГЛОНАСС	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
00000000035026	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник", строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного	Строительство			01.12.2021	Радченко Андрей Александрович	

Дополнительные контрольные точки

Обновить + Добавить - Удалить Редактировать

Наименование КТ	Дата достижения	Ответственный	Не используется
	=		

Рисунок 15. Редактирование объекта

2.1.1.2 Добавление дополнительной контрольной точки

При необходимости добавления дополнительной контрольной точки объекта результата (далее – ДКТ) необходимо выполнить следующие действия:

- выделить объект результата и нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 16);

Дополнительная контрольная точка

Сохранить Сохранить и закрыть

Наименование:

Дата достижения: 31.12.2021 Ответственный исполнитель: Топилин Максим Анатольевич

Характеристика:

☐ Не используется

Рисунок 16. Создание дополнительной контрольной точки

- поле «Наименование» заполняется с клавиатуры;
- поле «Дата достижения» автоматически заполняется датой достижения объекта результата. Для редактирования значения необходимо нажать кнопку «календарь» и выбрать дату.

Примечание. В Системе настроен контроль на не превышение даты достижения значения результата;

- поле «Ответственный исполнитель» заполнено автоматически ответственным исполнителем объекта результата. Значение можно редактировать путем его выбора из справочника «Ответственный исполнитель»;
- поле «Характеристика» заполняется с клавиатуры.

После заполнения указанных полей необходимо нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть» (Рисунок 17).

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Заккрыть

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "И" ИНН: 7705443646 КПП: 770701001

Ответственный исполнитель: Осинцев Владимир Геннадьевич Должность: Заместитель Министра культуры РФ

Объект

Обновить + Добавить - Удалить Поиск Просмотр объекта

Код	Наименование	Вид работ результата	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Координаты согласно ГЛОНАСС	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
00000000035026	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник", строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного	Не указано			01.12.2024	Осинцев Владимир Геннадьевич	

Дополнительные контрольные точки

Обновить + Добавить - Удалить Редактировать

Наименование КТ	Дата достижения	Ответственный	Не используется
Дополнительная экспертиза фундамента	01.12.2024	Осинцев Владимир Геннадьевич	<input type="checkbox"/>

Рисунок 17 .Дополнительная контрольная точка

2.1.1.3 Добавление объектов результатов к значению результата из нераспределенных значений

Часть объектов результатов не может быть автоматически распределена по значениям результатов. Такие объекты результатов отображаются в секции «Нераспределенные значения». Чтобы распределить эти объекты результатов, необходимо выполнить следующие действия:

- выделить объект результата, который находится в секции «Нераспределенные значения», и нажать кнопку «Редактировать» (Рисунок 18);

(АТ.01.03) Проведена реконструкция федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

Обновить Добавить Редактировать Удалить Массовое добавление ДКТ Просмотр объекта Легенда

☐ Скрыть КТ ☐ Скрыть неиспользуемые КТ

Наименование заказчика/объекта/контрольной точки	ИНН	Код ОКС	Вид работ результата	КТ не исп.	Ед. изм.	Значение	Дата достижения	Ответственный исполнитель
... Значение результата на 01.12.2020: распределено 0,0000 из 1,0000	Единица	1,0000	01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
▶ Значение результата на 01.12.2022: распределено 2,0000 из 1,0000	Единица	1,0000	01.12.2022	Осинцев Владимир Геннад...
Значение результата на 01.12.2024: распределено 0,0000 из 11,0000	Единица	11,0000	01.12.2024	Осинцев Владимир Геннад...
Значение результата на 01.12.2021: распределено 0,0000 из 1,0000	Единица	1,0000	01.12.2021	Осинцев Владимир Геннад...
Значение результата на 01.12.2023: распределено 0,0000 из 1,0000	Единица	1,0000	01.12.2023	Осинцев Владимир Геннад...
■ Нераспределенные значения								
▼ ■ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТ...	7705443646					1,0000		
▼ ■ 00000000035026 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры ...		000000000350...				1,0000		
▼ ■ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТ...	7705443646					1,0000		
▼ ■ 00000000035026 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, г. Рязань, ул. Соборная, д. 20 а. Внесение изменений		000000000350...				1,0000		
▼ ■ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТ...	7705443646					1,0000		
▼ ■ 00000000035026 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры ...		000000000350...				1,0000		
▼ ■ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТ...	7705443646					1,0000		
▼ ■ 00000000035026 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры ...		000000000350...				1,0000		
▼ ■ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТ...	7705443646					1,0000		
▼ ■ 00000000035026 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры ...		000000000350...				1,0000		
▼ ■ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТ...	7705443646					1,0000		
▼ ■ 00000000035026 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры ...		000000000350...				1,0000		
▼ ■ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТ...	7705443646					1,0000		

Рисунок 18. Редактирование объекта результата

- в открывшемся окне «Редактирование значения результата» выбрать значение результата, к которому необходимо добавить объект результата, и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 19)

2.1.2 Распределение результатов, реализуемых с участием регионов

Распределение результата федерального проекта с типом «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества», в реализации которого участвуют регионы, осуществляется автоматически на основании данных паспорта проекта (результаты, в рамках которых реализуются объекты капитального строительства регионов и декомпозированные КТ из Общего плана проекта) и данных по объектам капитального строительства из программного модуля «Соглашения» справочник «Перечень объектов капитального строительства» подсистемы бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет». Данная информация доступна только на просмотр.

Для просмотра необходимо выполнить следующие действия:

- выбрать результат федерального проекта, у которого в колонке «Реализуется регионом» указано значение «Да», и нажать кнопку «Редактировать» (Рисунок 21);

Тип результата	Единица измерения	Реализуется регионом	Значение	Дата достижения значения результата	Значение на год	Распределено	Остаток
A1.01.02 Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 39,0000, Дата достижения: 31.12.2024, единица измерения: Единица							
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	Да	8,0000	31.12.2022	8,0000	8,0000	0,0000
Строительство (реконстру...	Единица	Да	23,0000	31.12.2023	23,0000	14,0000	9,0000
Строительство (реконстру...	Единица	Да	39,0000	31.12.2024	39,0000	15,0000	24,0000
A1.01.03 Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды Значение: 15,0000, Дата достижения: 01.12.2024, единица измерения: Единица							
Заказчики							
Заказчик ↑		Распределено значений					
		31.12.2022		31.12.2023		31.12.2024	
Итого:		8,0000		14,0000		15,0000	
Саратовская область		0,0000		1,0000		0,0000	
Свердловская область		0,0000		1,0000		0,0000	
Тамбовская область		0,0000		0,0000		1,0000	
Тульская область		0,0000		1,0000		0,0000	
Челябинская область		0,0000		1,0000		0,0000	
Ярославская область		0,0000		1,0000		0,0000	

Рисунок 21. Редактирование результата

- откроется окно редактирования результата.

В открывшемся окне отображаются данные, сформированные автоматически (Рисунок 22).

(A1.01.02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек							
Наименование заказчика	Код ОКС	Вид работ результата	Ед. изм.	Значение	Дата достижения	Ответственный исполнитель	
Значение результата на 31.12.2022: распределено 8,0000 из 8,0000			Единица	8,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
Кабардино-Балкарская Республика: распределено 0,0000 из 1,0000				1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
Магаданская область: распределено 1,0000 из 1,0000				1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
244701000001200002 Строительство Центра культурного развития по адрес...	244701000001200002		Единица	1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
Республика Дагестан: распределено 0,0000 из 1,0000				1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
Республика Коми: распределено 1,0000 из 1,0000				1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
287701000001200001 Строительство Центра культурного развития по адрес...	287701000001200001		Единица	1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
Республика Саха (Якутия): распределено 1,0000 из 1,0000				1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
398629155051200001 Строительство Центра культурного развития по адрес...	398629155051200001		Единица	1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
Хабаровский край: распределено 1,0000 из 1,0000				1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
308631101001200001 Строительство Центра культурного развития по адрес...	308631101001200001		Единица	1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
Чеченская Республика: распределено 1,0000 из 1,0000				1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
396701000001200001 Строительство Центра культурного развития по адрес...	396701000001200001		Единица	1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
Чукотский автономный округ: распределено 1,0000 из 1,0000				1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
377705000001200001 Строительство Центра культурного развития по адрес...	377705000001200001		Единица	1,0000	31.12.2022	Осинцев Владимир Геннадьев...	
Значение результата на 31.12.2023: распределено 14,0000 из 23,0000			Единица	23,0000	31.12.2023	Осинцев Владимир Геннадьев...	
Воронежская область: распределено 1,0000 из 1,0000				1,0000	31.12.2023	Осинцев Владимир Геннадьев...	
320621101001200001 Строительство Центра культурного развития по адрес...	320621101001200001		Единица	1,0000	31.12.2023	Осинцев Владимир Геннадьев...	
Курганская область: распределено 1,0000 из 1,0000				1,0000	31.12.2023	Осинцев Владимир Геннадьев...	
337701000001200001 Строительство Центра культурного развития по адрес...	337701000001200001		Единица	1,0000	31.12.2023	Осинцев Владимир Геннадьев...	

Рисунок 22. Данные по заказчикам и объектам

- для просмотра более подробной информации по объекту выделить его и нажать кнопку «Просмотр» (Рисунок 23);

The screenshot shows the 'Электронный бюджет' (Electronic Budget) software interface. The main window displays a list of objects, and a 'Просмотр объекта' (View Object) window is open, showing detailed information about a specific object. The 'Просмотр объекта' button is highlighted with a red box and an arrow. The detailed information includes:

- Наименование:** Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Набережная реки Магаданки
- Код:** 244701000001200002
- Сметная стоимость (тыс. руб.):** 143 469,39
- Форма собственности:** Собственность субъекта РФ
- Номер соглашения:** 054-09-2020-371
- Мощность:** 2 000,0000
- Единица измерения:** Квадратный метр
- Сроки проведения работ:** Дата начала: 01.01.2021, Дата окончания: 31.12.2022
- Местонахождение:** Код территории (ОКМО): 44701000001, Наименование территории: г Магадан
- Адрес:** город Магадан, в районе улицы Набережная реки Магаданки
- Объем финансового обеспечения на 2022 год (тыс. руб):** Всего: 140 600,00, из них: федеральный бюджет: 140 600,00
- ОКС:** 054 0801 11 2 А1 52330 522 12
- Адрес объекта (в соответствии с ФИАС):**
- Координаты согласно ГЛОНАСС:**
- Характеристика:**

Рисунок 23. Просмотр объекта

В случае необходимости внесения изменений в информацию об объекте капитального строительства они осуществляются в программном модуле «Соглашения» справочник «Перечень объектов капитального строительства» подсистемы бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет».

2.2 Распределение результатов с типом «Принятие нормативного правового (правового) акта»

Для распределения результата федерального проекта с типом «Принятие нормативного правового (правового) акта» необходимо выбрать результат федерального проекта, у которого в колонке «Реализуется регионом» указано значение «Нет», и нажать кнопку «Редактировать» (Рисунок 24);

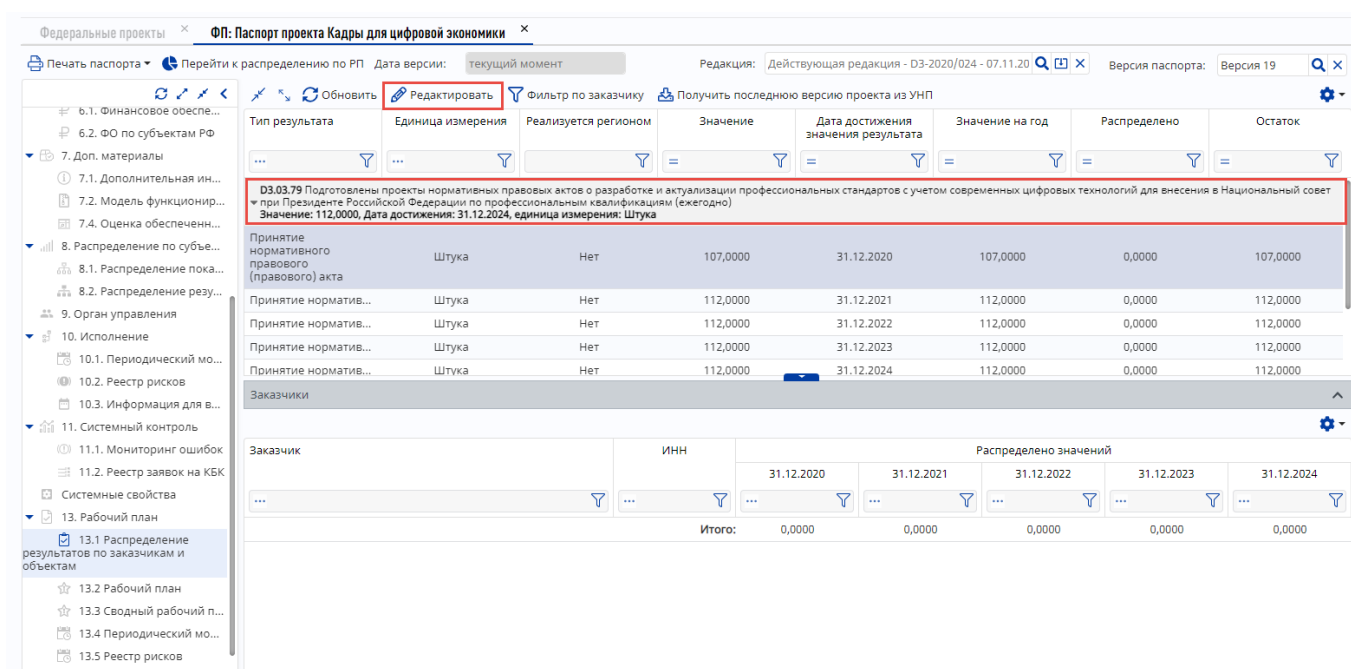


Рисунок 24. Редактирование результата

В открывшемся окне отображаются данные по значениям результата, сформированные автоматически на основании данных раздела «5.1 Общий план».

2.2.1.1 Добавление заказчика и объекта результата

Под заказчиком объектов результатов с типом «Принятие нормативного правового акта» подразумевается ФОИВ, ответственный за объект результата.

Для добавления заказчика и объекта результата необходимо выполнить следующие действия:

- выделить значение результата, для которого необходимо добавить объект результата, и нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 25);

(03.03.79) Подготовлены проекты нормативных правовых актов о разработке и актуализации профессиональных стандартов с учетом современных цифровых технологий для внесения в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профес...

Обновить Добавить Редактировать Удалить Массовое добавление ДКТ Просмотр объекта Легенда

Наименование заказчика/объекта/контрольной точки ↑

ИИН	Вид нормативного пр...	КТ не исп.	Ед. изм.	Значение	Дата достижения	Ответственный исполнитель
...	=	=	...
Значение результата на 31.12.2020: распределено 0,0000 из 107,0000			Штука	107,0000	31.12.2020	Топилин Максим Анатолье...
Значение результата на 31.12.2021: распределено 0,0000 из 112,0000			Штука	112,0000	31.12.2021	Топилин Максим Анатольевич
Значение результата на 31.12.2022: распределено 0,0000 из 112,0000			Штука	112,0000	31.12.2022	Топилин Максим Анатолье...
Значение результата на 31.12.2023: распределено 0,0000 из 112,0000			Штука	112,0000	31.12.2023	Топилин Максим Анатолье...
Значение результата на 31.12.2024: распределено 0,0000 из 112,0000			Штука	112,0000	31.12.2024	Топилин Максим Анатолье...

Рисунок 25. Добавление объекта

- откроется окно «Заказчики и объекты» с возможностью редактирования данных в секции «Заказчик», в поле «Наименование организации» и «Ответственный исполнитель», а также добавления объекта результата и его дополнительных контрольных точек.
- Данные в секции «Заказчик» по умолчанию заполняются на основе сведений об организации ответственного исполнителя, указанного в разделе «Общий план» паспорта федерального проекта, с возможностью последующей корректировки.



В случае необходимости редактирования поля «Наименование организации» нужно нажать кнопку «лупа» (Рисунок 26)



Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закреть

Необходимо сохранить изменения по заказчику перед добавлением данных по объекту

Заказчик

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИИ   ИНН: 7710914971 КПП: 771001001

Ответственный исполнитель: Топилин Максим Анатольевич   Должность: Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

Объект

Обновить + Добавить Редактировать Удалить Поиск Просмотр объекта

Номер НПА	Наименование	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
...	=

Дополнительные контрольные точки

Обновить + Добавить Удалить Редактировать

Наименование КТ	Дата достижения	Ответственный	Не используется
...	=

Рисунок 26. Редактирование организации Заказчика

— в открывшемся справочнике «Сводный реестр участников/ неучастников бюджетного процесса» выбрать организацию и нажать кнопку «Выбрать» (Рисунок 27).




Рисунок 27. Выбор организации Заказчика

В случае необходимости редактирования поля «Ответственный исполнитель» нужно нажать кнопку «лупа» (Рисунок 28)

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закрыть

Необходимо сохранить изменения по заказчику перед добавлением данных по объекту

Заказчик

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИИ

ИНН: 7710914971

КПП: 771001001

Ответственный исполнитель: Топилин Максим Анатольевич

Должность: Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

Объект

Обновить Добавить Редактировать Удалить Просмотр объекта

Номер НПА	Наименование	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
...	=

Дополнительные контрольные точки

Рисунок 28. Редактирование ответственного исполнителя

— в открывшемся окне отобразятся сотрудники выбранной организации. Необходимо выбрать сотрудника и нажать кнопку «Выбрать» (Рисунок 29);

Ответственный исполнитель

ФИО	Должность	Организация	Логин
...
Сыч А А	Специалист 1 разряда отдела ...	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦ...	149_Sych.AA
Корецкий Георгий Анатольевич	Заместитель начальника отдела	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦ...	149_Koretskiy.GA
Девятникова Т Н	Старший специалист 1 разряд...	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦ...	149_Devyatnicova.TN
Никифорова И Г	Консультант отдела методологии финансово-бюджетной политики, имущественных отношений, бюджетного учета и отчетности	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	149_Nikifiriva.IG
Привезенцева Светлана Викто...	Директор Департамента	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦ...	149_Privezenceva.SV
Шалаева Ольга Ивановна	Заместитель директора Финан...	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦ...	149_Shalaeva.OI
Семенова Лариса Борисовна	Начальник отдела	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦ...	149_Semenova.LB
Колесников Павел Васильевич	Советник	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦ...	149_Kolesnikov.PV
Щепакина Лидия Михайловна	Советник Министра труда и со...	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦ...	149_Shepakina.LM_OI
Обеременко Сергей Вадимович	Начальник отдела	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦ...	149_Oberemenko.SV

Рисунок 29. Выбор ответственного исполнителя

— нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 30).

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закрыть

Необходимо сохранить изменения по заказчику перед добавлением данных по объекту

Заказчик

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИИ

ИНН: 7710914971

КПП: 771001001

Ответственный исполнитель: Никифорова И Г

Должность: Консультант отдела методологии финансово-бюджетной политики, имущественных отношений

Объект

Обновить + Добавить Редактировать Удалить Просмотр объекта

Номер НПА	Наименование	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
...	=

Дополнительные контрольные точки

Рисунок 30. Сохранение данных секции «Заказчик»

Добавление объекта результата осуществляется нажатием на кнопку «Добавить» (Рисунок 31)

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закрыть

Заказчик

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКО

ИНН: 7710914971

КПП: 771001001

Ответственный исполнитель: Никифорова И Г

Должность: Консультант отдела методологии финансово-бюджетной политики, имущественных отношений

Объект

Обновить + Добавить Редактировать Удалить Просмотр объекта

Номер НПА	Наименование	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
...	=

Дополнительные контрольные точки

Рисунок 31. Добавление объекта

— в открывшемся окне поле «Статус НПА» заполняется автоматически значением «Проект» (Рисунок 32):




Рисунок 32. Добавление объекта результата в статусе «Проект»

- поле «Наименование» заполняется вручную с клавиатуры;
-
- поле «Вид НПА» заполняется из выпадающего списка;
- поле «Орган, принявший документ» заполняется путем выбора значения из соответствующего справочника.
- поле «Дата достижения» автоматически заполняется датой достижения значения результата. Для редактирования значения необходимо нажать кнопку «календарь» и выбрать дату.

Примечание. В Системе настроен контроль на не превышение даты достижения значения результата;

- поле «Ответственный исполнитель» по умолчанию заполняется ответственным исполнителем Заказчика с возможностью последующей корректировки путем выбора значения из справочника «Ответственный исполнитель»;
- поле «Характеристика» заполняется с клавиатуры;

- заполнив указанные поля, необходимо сохранить данные нажатием кнопки «Сохранить» или «Сохранить и закрыть» (Рисунок 33);

Рисунок 33. Добавление объекта результата

- для редактирования объекта результата необходимо выделить объект и нажать кнопку «Редактировать» (Рисунок 34);

Рисунок 34. Редактирование объекта результата

- для удаления объекта результата необходимо выделить объект и нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 35);

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закреть

Заказчик

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКО
ИНН: 7710914971
КПП: 771001001

Ответственный исполнитель: Никифорова И Г
Должность: Консультант отдела методологии финансово-бюджетной политики, имущественных отношений

Объект

Обновить + Добавить Редактировать **Удалить** Просмотр объекта

Номер НПА	Наименование	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
2684-р	Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об определении федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности	Распоряжение Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)	31.12.2021	Топилин Максим Анатольевич	

Дополнительные контрольные точки

Рисунок 35. Удаление объекта результата

- для просмотра данных объекта результата необходимо выделить объект и нажать кнопку «Просмотр» (Рисунок 36).

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закреть

Заказчик

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКО
ИНН: 7710914971
КПП: 771001001

Ответственный исполнитель: Никифорова И Г
Должность: Консультант отдела методологии финансово-бюджетной политики, имущественных отношений

Объект

Обновить + Добавить Редактировать **Просмотр объекта**

Наименование:
Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об определении федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности

Номер НПА: 2684-р
Дата принятия: 14.11.2019
Дата достижения: 31.12.2021
Вид НПА: 3

Орган, принявший документ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Характеристика:

Дополнительные контрольные точки

Рисунок 36. Просмотр данных по объекту результата

2.2.1.2 Добавление дополнительной контрольной точки объекта результата

Для добавления ДКТ объекта результата необходимо выполнить следующие действия:

- выделить объект результата и нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 37):

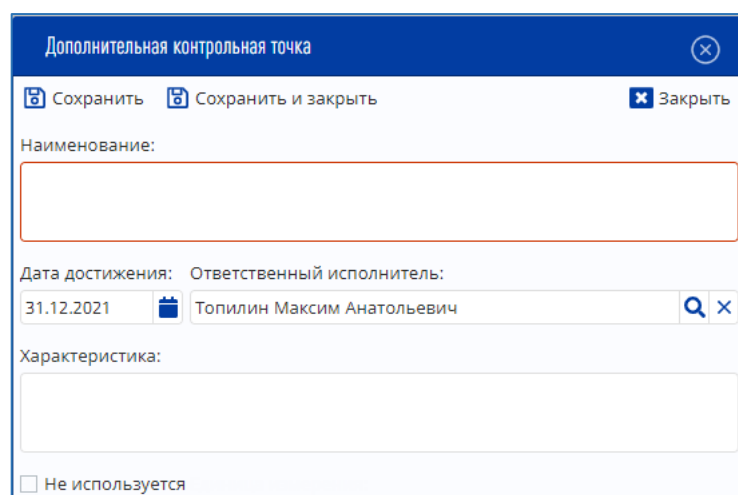


Рисунок 37. Создание дополнительной контрольной точки

- поле «Наименование» заполняется с клавиатуры;
- поле «Дата достижения» автоматически заполняется датой достижения объекта результата. Для редактирования значения необходимо нажать кнопку вызова календаря и выбрать дату.

Примечание. В Системе настроен контроль на неперевышение даты достижения объекта результата;

- поле «Ответственный исполнитель» заполнено автоматически ответственным исполнителем объекта результата. Ответственного исполнителя можно редактировать путем выбора из справочника «Ответственный исполнитель»;
- поле «Характеристика» заполняется с клавиатуры.
- после заполнения обязательных полей сохранить данные нажатием кнопки «Сохранить» или «Сохранить и закрыть» (Рисунок 38);

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Заккрыть

Заказчик

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКИ... ИНН: 7710914971 КПП: 771001001

Ответственный исполнитель: Никифорова И Г Должность: Консультант отдела методологии финансово-бюджетной политики, имущественных отношен

Объект

Обновить + Добавить Редактировать Удалить Поиск объекта

Номер НПА	Наименование НПА	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
2684-р	Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об определении федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности»	Распоряжение Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)	31.12.2021	Топилин Максим Анатольевич	

Дополнительные контрольные точки

Обновить + Добавить Удалить Редактировать

Наименование КТ	Дата достижения	Ответственный	Не используется
Дополнительное экспертиза документа	31.12.2021	Топилин Максим Анатольев...	<input type="checkbox"/>

Рисунок 38. Дополнительная контрольная точка

- для редактирования ДКТ выделить значение и нажать кнопку «Редактировать» (Рисунок 39);

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Заккрыть

Заказчик

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКИ... ИНН: 7710914971 КПП: 771001001

Ответственный исполнитель: Никифорова И Г Должность: Консультант отдела методологии финансово-бюджетной политики, имущественных отношен

Объект

Обновить + Добавить Редактировать Удалить Поиск объекта

Номер НПА	Наименование	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
2684-р	Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об определении федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности»	Распоряжение Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)	31.12.2021	Топилин Максим Анатольевич	

Дополнительные контрольные точки

Обновить + Добавить Удалить **Редактировать**

Наименование КТ	Дата достижения	Ответственный	Не используется
Дополнительное исследование земельного участка	31.12.2021	Топилин Максим Анатольевич	<input type="checkbox"/>

Рисунок 39. Редактирование ДКТ

- для удаления ДКТ выделить ДКТ и нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 40).

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Заккрыть

Заказчик

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКИ
ИНН: 7710914971
КПП: 771001001

Ответственный исполнитель: Никифорова И Г
Должность: Консультант отдела методологии финансово-бюджетной политики, имущественных отношен

Объект

Обновить + Добавить Редактировать Удалить Просмотр объекта

Номер НПА	Наименование	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
2684-р	Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об определении федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности	Распоряжение Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)	31.12.2021	Топилин Максим Анатольевич	

Дополнительные контрольные точки

Обновить + Добавить Удалить Редактировать

Наименование КТ	Дата достижения	Ответственный	Не используется
Дополнительное исследование земельного участка	31.12.2021	Топилин Максим Анатольевич	<input type="checkbox"/>

Рисунок 40. Удаление ДКТ

3 РАБОЧИЙ ПЛАН ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Раздел «Рабочий план» предназначен для отображения обобщенной информации по результатам проекта: о датах достижения, ответственных исполнителях, объектах результатов и их контрольных точках. Также из данного раздела осуществляется формирование печатной формы документа «Рабочий план». Также из данного раздела направляются данные по результатам, Объектам результатов и их контрольных точках на согласование с администратором проекта.

Отображение данных в Рабочем плане федерального проекта осуществляется в зависимости от роли пользователя. Редактирование данных в разделе «Рабочий план» запрещено.

Для перехода в раздел на интерфейс «Рабочий план» необходимо в меню выбрать раздел «13.2. Рабочий план» (Рисунок 41).

Наименование	Вид работ резу... Вид НПА	Мощность объекта		Значение	Ед. изм.	Дата достижен...	Ответственный исполнитель
		Ед. изм.	Количество				
...
A1.01.02 Построены центры культурного развития в субъектах Российско...				39,00	Ед...	31.12.2024	Осинцев Владимир Ген...
A1.01.03 Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культу...				15,00	Ед...	01.12.2024	Осинцев Владимир Ген...
A1.01.04 Проведена реновация региональных и (или) муниципальных уч...				15,00	Ед...	31.12.2024	Осинцев Владимир Ген...
A1.03.01 Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтир...				560,00	Ед...	31.12.2024	Осинцев Владимир Ген...
A1.03.02 Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учре...				26,00	Ед...	31.12.2021	Осинцев Владимир Ген...
Значение результата: 17 на 31.12.2020				17,00	Ед...	31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...
Кабардино-Балкарская Республика				2,00		31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...
Дом культуры на 400 мест в с.п. Нартан Чегемского р-на КБР	Место	400,00	1,00	Ед...	31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...	
Дом культуры на 400 мест в с.п. Нартан Чегемского р-на КБР	Место	400,00	1,00	Ед...	31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...	
Республика Адыгея (Адыгея)				1,00		31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...
Дом культуры в ауле Ходзь МО "Кошехабльский район" Республ...	Место	300,00	1,00	Ед...	31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...	
Карачаево-Черкесская Республика				4,00		31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...
Строительство дома культуры на 250 мест в а.Бесленей Хабезк...	Место	250,00	1,00	Ед...	31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...	
Реконструкция Дома Культуры по ул.У. Алиева, 13А в с. Учкеекн, ...	Место	300,00	1,00	Ед...	31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...	
Строительство дома культуры на 250 мест в а.Бесленей Хабезк...	Место	250,00	1,00	Ед...	31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...	
Реконструкция Дома Культуры по ул.У. Алиева, 13А в с. Учкеекн, ...	Место	300,00	1,00	Ед...	31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...	
Республика Алтай				1,00		31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...
Архангельская область				2,00		31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...
Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ил...	Место	120,00	1,00	Ед...	31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...	
Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ил...	Место	120,00	1,00	Ед...	31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...	
Астраханская область				1,00		31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...
Строительство сельского дома культуры на 200 мест в п.с. Полю...	Место	200,00	1,00	Ед...	31.12.2020	Осинцев Владимир Ген...	

Рисунок 41. Рабочий план

В данном разделе есть возможность сформировать печатную форму документа «Рабочий план», для этого необходимо на панели кнопок нажать кнопку «Печать».

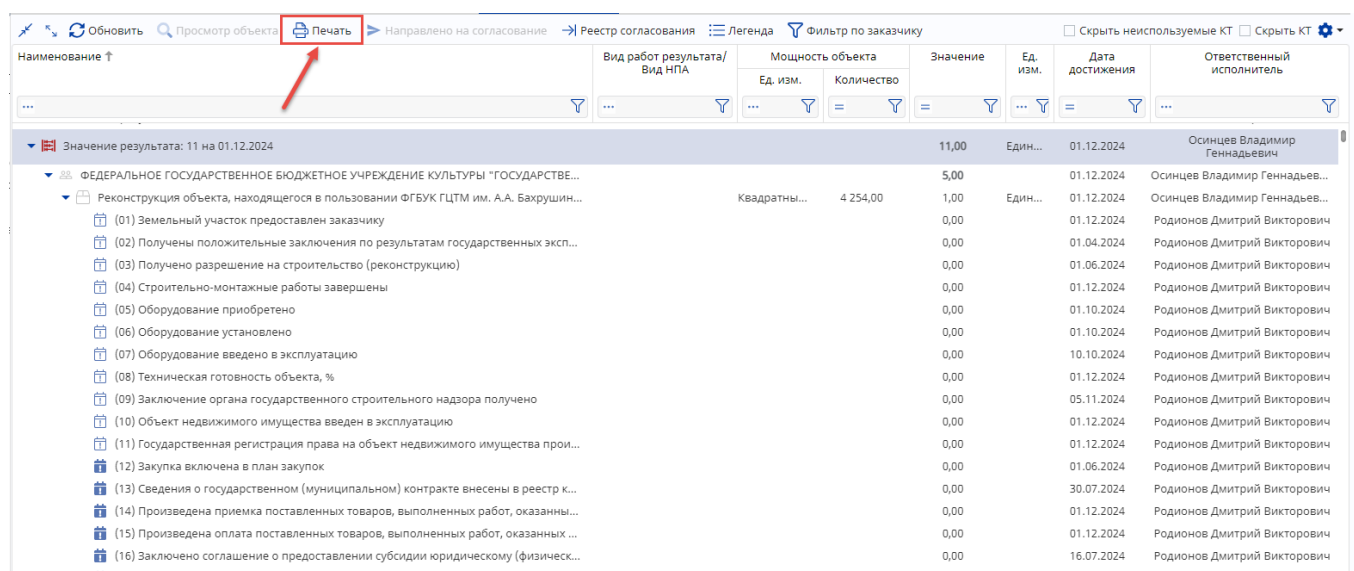






Рисунок 42 – Печать документа «Рабочий план»







Для удобства отображения данных рабочего плана, в каждой колонке имеется строка фильтрации, также можно воспользоваться кнопками «Скрыть неиспользуемые КТ», по нажатию которой скроются КТ с признаком «Не используется» и кнопкой «Скрыть КТ» по нажатию которой, скроются все контрольные точки.

Для удобства фильтрации данных по заказчикам есть кнопка «Фильтр по заказчику» по нажатию, которой открывается окно, в котором можно выбрать одного или нескольких заказчиков.

Описание кнопок раздела «Рабочий план» представлено в таблице (Таблица 1).

Таблица 1. Описание кнопок

Название кнопки	Описание кнопки
 – Обновить	Обновляет данные на интерфейсе
 – Просмотр	Открывает окно просмотра информации по объекту результата
 – Печать	Формирует печатную форму документа «Рабочий план»
 – Направить на согласование	Осуществляет направление документа «Рабочий план» на внутреннее согласование

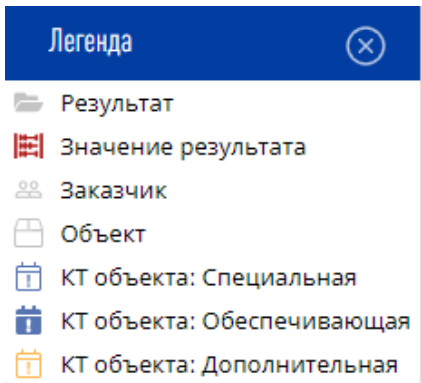Название кнопки	Описание кнопки
 – Реестр согласования	Осуществляет переход в «Реестр согласования документов»
 – Легенда	Открывает окно с обозначением иконок элементов рабочего плана 
 – Фильтр по заказчику	Открывает окно с выбором заказчиков для последующей фильтрации данных по ним на интерфейсе
 – Скрыть неиспользуемые КТ	Скрывает контрольные точки с признаком «Не используется»
 – Скрыть КТ	Скрывает контрольные точки

3.1 Направление данных по результату, объектам результата и их контрольным точкам на согласование администратору

Для отправки данных по результату, объектам и их контрольным точкам на согласование администратору проекта, в разделе 13.2 Рабочий план» требуется выделить результат и нажать кнопку «Направить на согласование». У результата в колонке «Статус» установится статус «На согласовании», редактирование результата, объектов результатов и их контрольных точек станет недоступным. Если данные по результату, объектам и их контрольным точкам будут согласованы администратором, то в колонке «Статус» установится статус «Согласован».

Если данные по результату, объектам и их контрольным точкам не будут согласованы, то в колонке «Статус» установится статус «На доработке», в поле

причина возврата на доработку будет указана причина возврата. Необходимо исправить данные по результату, объектам и их контрольным точкам в соответствии с причиной возврата на доработку, после чего повторно направить на согласование администратору.

4 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧИЙ ПЛАН

Внесение изменений в рабочий план производится в версии рабочего, которая находится в статусе «Черновик». Все версии документа Рабочий план отображаются в разделе «13.7 Версии рабочего плана». Действующей версией документа может быть только одна версия, предыдущая версия закрываются автоматически в момент утверждения новой версии. Также в момент утверждения новой версии автоматически создается версия «Черновик». Для перехода в нужную версию необходимо выделить запись и нажать кнопку «Выбрать» (Рисунок 43)

Обновить **Выбрать** + Добавить

Наименование	Статус версии	Дата создания
Версия 1	Действующая версия	11.12.2020
Версия 2	Черновик	12.12.2020

Стр. 1 из 1

Записи с 1 по 2, всего 2

Обновить

Название	Новое значен...	Старое значе...	Значение пре...	Автор изменений	Дата изменен...
...	=

Рисунок 43 – Выбор версии

В версии «Черновик», ответственные исполнители Рабочего плана имеют возможность вносить соответствующие изменения в разделе «13.1 Распределение результатов по заказчикам и объектам».

По итогам внесения изменений Рабочий план направляется на согласование и утверждение на этап ВПО.

[illegible]
